

Nr.		Vorgangstyp	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	M	D
1			Bedarfsklärung	6 d	Don 28.09.17	Don 05.10.17				
2			Vorprojekt-Bedarfsklärung	5 d	Don 28.09.17	Mit 04.10.17		Planer		
3			Bestandsaufnahme	1 d	Don 05.10.17	Don 05.10.17	2	Planer		
4			Planung	10 d	Don 28.09.17	Mit 11.10.17				
5			Kalkulation/Budgetierung	1 d	Don 28.09.17	Don 28.09.17		Planer		
6			Transportgenehmigungen	1 d	Die 10.10.17	Die 10.10.17	8	Planer		
7			Angebotsausschreibung	1 d	Fre 06.10.17	Fre 06.10.17	3	Planer		
8			Zeitplanung	1 d	Mon 09.10.17	Mon 09.10.17	7	Planer		
9			Auftragsvergabe	1 d	Mit 11.10.17	Mit 11.10.17	6	Planer		
10			Infrastruktur	12 d	Don 12.10.17	Fre 27.10.17				
11			Standort	1 d	Don 12.10.17	Don 12.10.17	9	Monteur_1		
12			Verkehrswege/Anbindung	10 d	Fre 13.10.17	Fre 27.10.17	11	Monteur_2		
13			Druckluftversorgung	1 d	Fre 13.10.17	Fre 13.10.17	11	Monteur_2		
14			Strom	1 d	Fre 13.10.17	Fre 13.10.17	11	Monteur_2		
15			Demontage	14 d	Don 12.10.17	Die 31.10.17				
16			Demontage / Verpackung	10 d	Don 12.10.17	Mit 25.10.17	9	Monteur_1;Monteur_2		
17			Transport zum Verladeplatz	4 d	Don 26.10.17	Die 31.10.17	16	Monteur_1;Monteur_2		
18			Verladung	3 d	Don 26.10.17	Mon 30.10.17				
19			LKW, Kran	3 d	Don 26.10.17	Mon 30.10.17	16	Fahrer;Kranführer;Tran		
20			Transportsicherung	1 d	Don 26.10.17	Don 26.10.17	16	Fahrer;Transporthelfer		
21			Transport	2 d	Fre 27.10.17	Mon 30.10.17				
22			Transport an neuen Standort	2 d	Fre 27.10.17	Mon 30.10.17	20	Fahrer;Transporthelfer		


Projekt: Maschinenumzug_Rev1
Datum: Son 28.04.19

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Kritisch	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Kritische Unterbrechung	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende		Manueller Fortschritt	

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	M	D
23		Transportbegleitung	2 d	Fre 27.10.17	Mon 30.10.17	20	Begleitfahrer		
24		Montage	19 d	Die 31.10.17	Fre 24.11.17				
25		Kran zur Entladung	1 d	Die 31.10.17	Die 31.10.17	23	Kranführer;Transporthe		
26		Transport zum Standort	1 d	Mit 01.11.17	Mit 01.11.17	25	Monteur_1;Monteur_2		
27		Montage	15 d	Don 02.11.17	Mit 22.11.17	26			
28		Inbetriebnahme	2 d	Don 23.11.17	Fre 24.11.17	27	Monteur_1		
29		Abnahme	0 d	Fre 24.11.17	Fre 24.11.17	28			
30		Kundenabnahme	1 d	Mon 27.11.17	Mon 27.11.17	28	Monteur_1		


Projekt: Maschinenumzug_Rev1
Datum: Son 28.04.19

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Kritisch	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Kritische Unterbrechung	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende		Manueller Fortschritt	

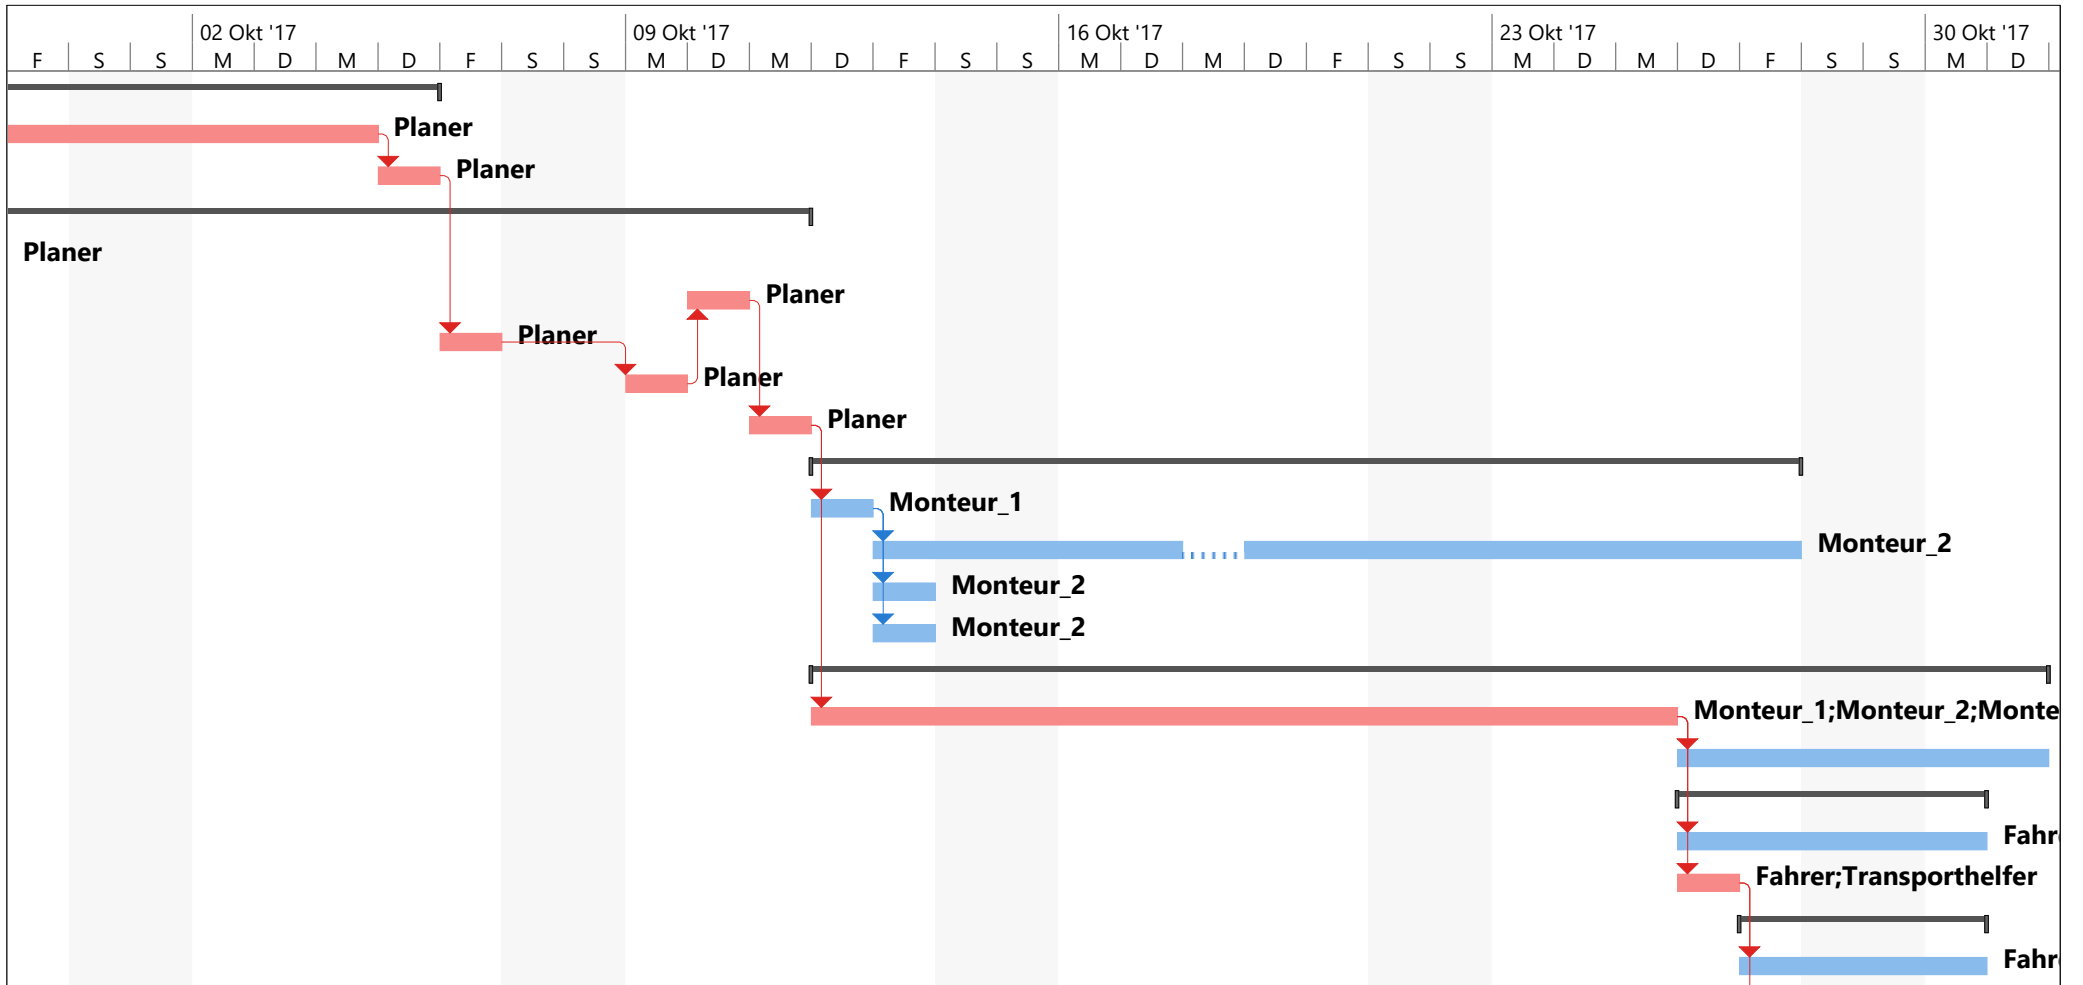


Projekt: Maschinenumzug_Rev1
 Datum: Son 28.04.19

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Kritisch	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Kritische Unterbrechung	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende		Manueller Fortschritt	




Projekt: Maschinenumzug_Rev1 Datum: Son 28.04.19	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Kritisch	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Kritische Unterbrechung	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende		Manueller Fortschritt	

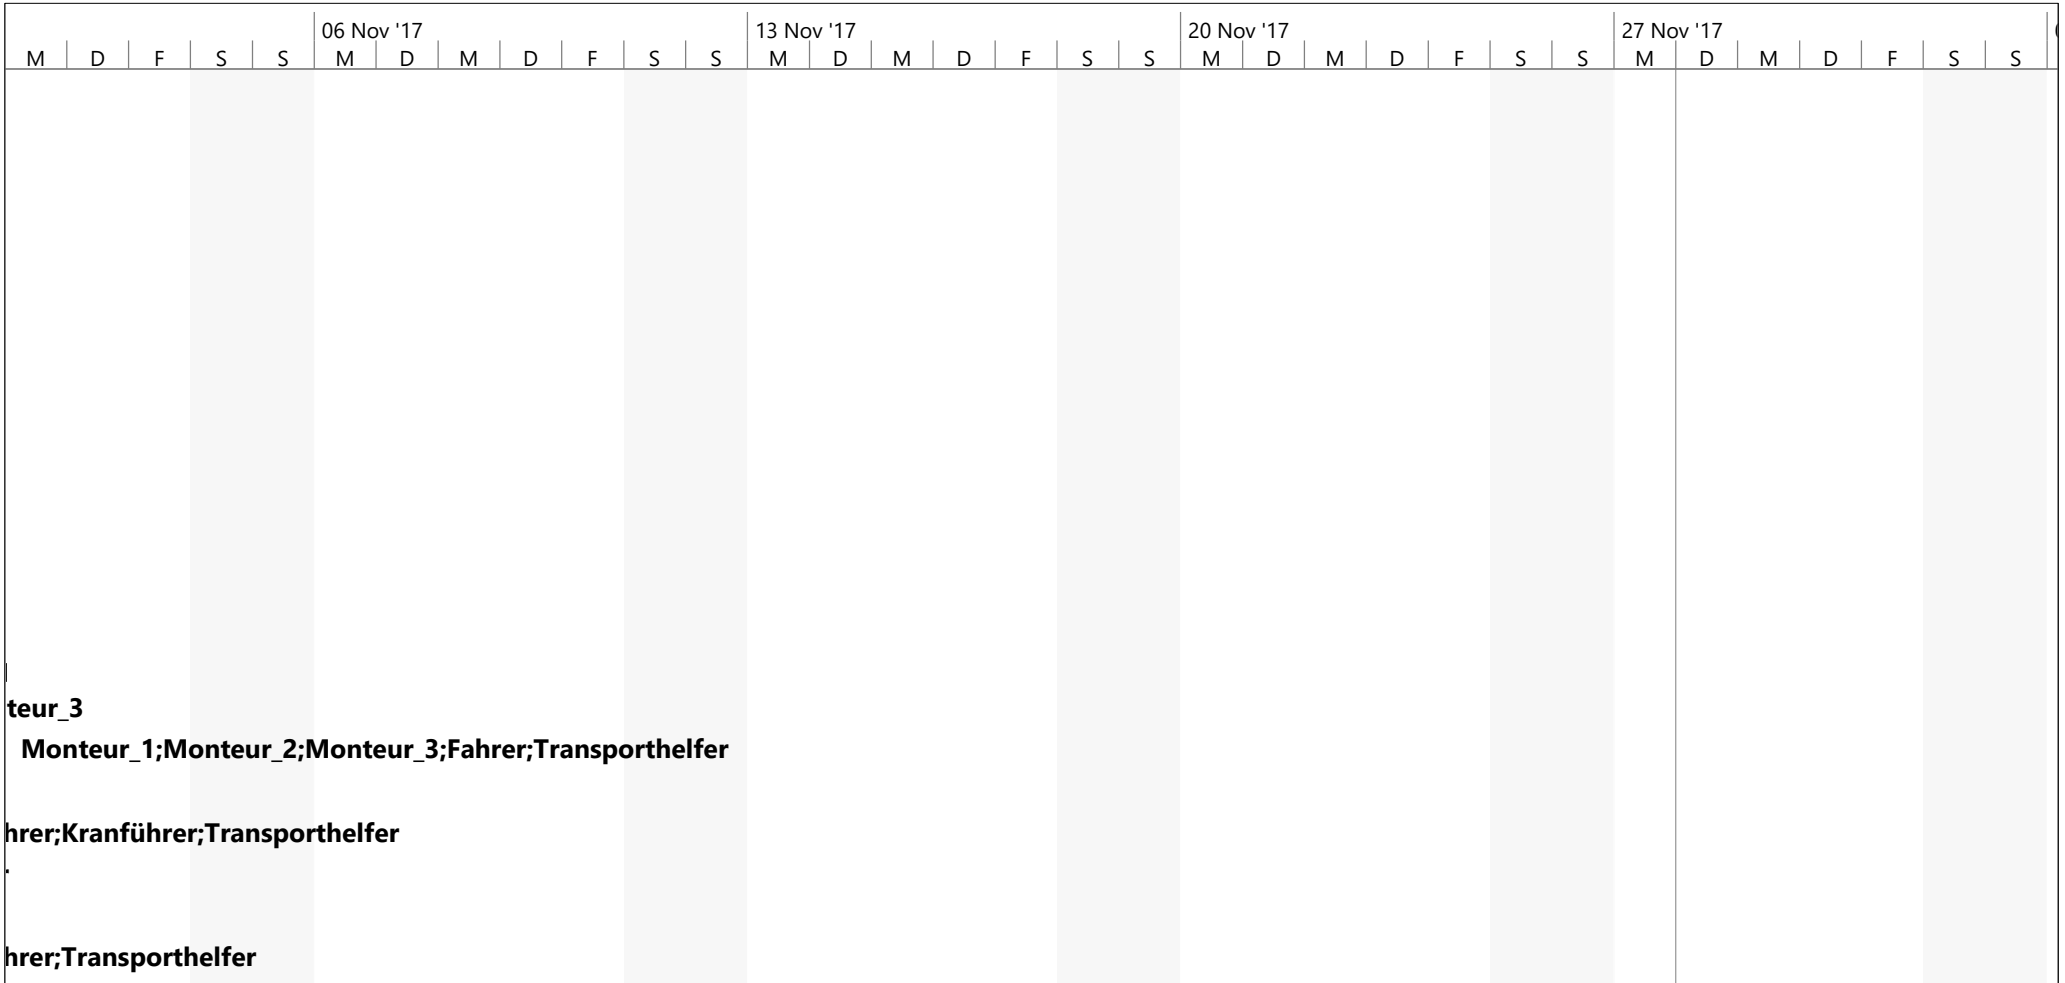

Projekt: Maschinenumzug_Rev1
Datum: Son 28.04.19

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Kritisch	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Kritische Unterbrechung	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende		Manueller Fortschritt	

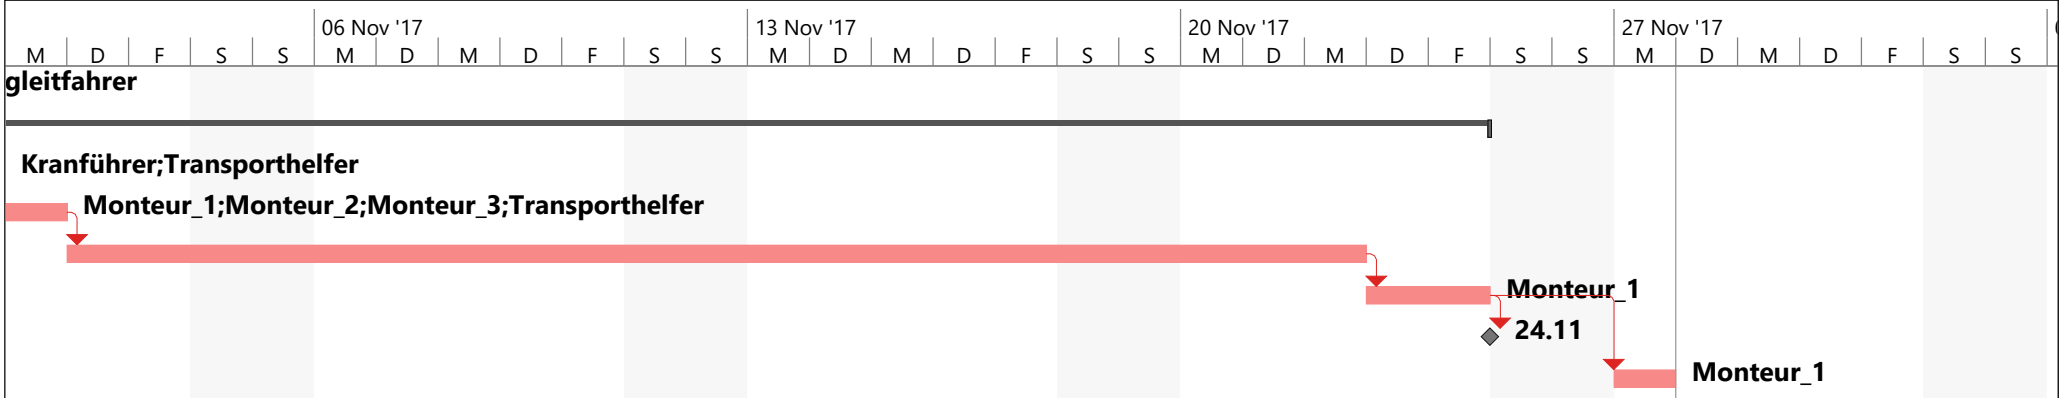

Projekt: Maschinenumzug_Rev1
 Datum: Son 28.04.19

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Kritisch	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Kritische Unterbrechung	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang		In Arbeit	
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende		Manueller Fortschritt	
