



Maschinen Umzug Auftrags-Report

Auftrags-Nr.: 4711

Guido Heinemann

Exxxxx

31.08.2017

Report-Nr.	Datum
1	28.09.2017
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Leistungsumfang

- Projekt Maschinenumzug

Kunde: Fa. Kunde

Besonderheiten:

- Maschinengewicht 60 t.
- Transportbreite über 4m
- Neues Industriegebiet, schlechte Zufahrt

Risiken:

- Verzug Maschinenbett
- Verzögerungen durch schlechtes Wetter

Terminplan

Vorhergehender Meilenstein: Transport


- Plan: KW 43
- Ist: KW

Nächster Meilenstein: Kundenabnahme

- Plan: 27.11.2017
- Prognose: 27.11.2017

Anmerkungen: *Beispiel*

- z. Zt. alles termingerecht.....
- Geldstrafen konnten abgewendet werden durch

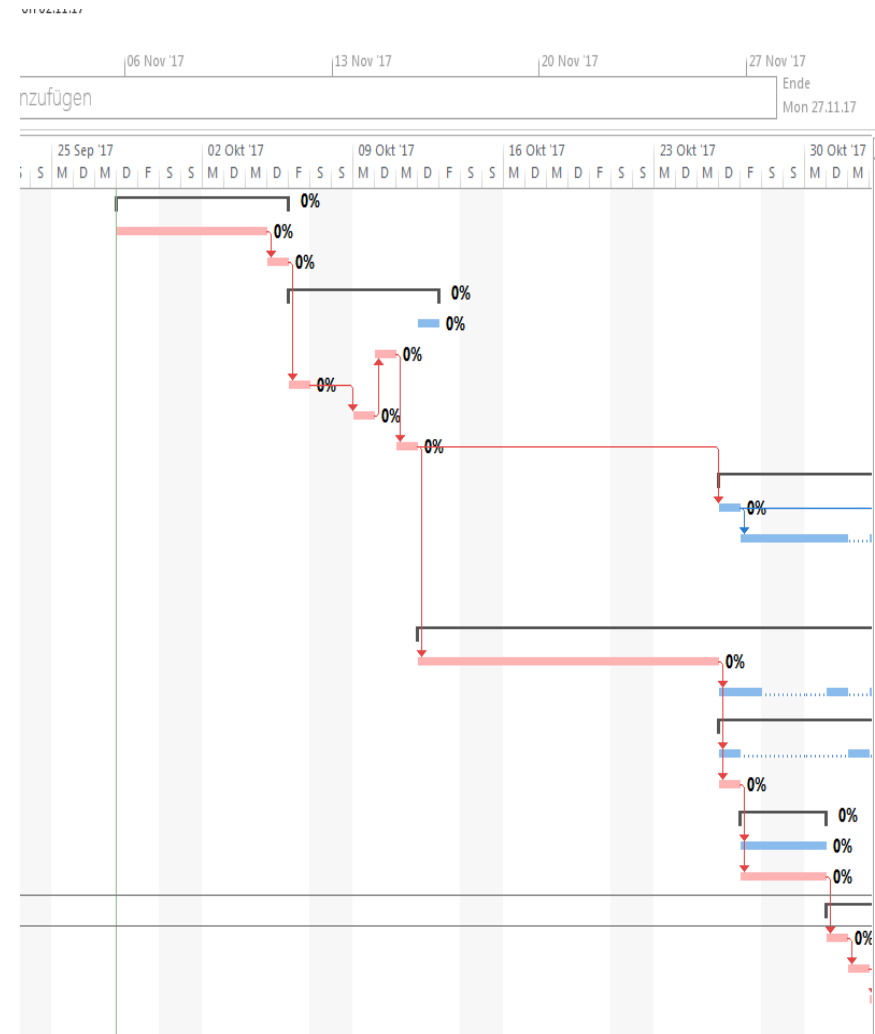

[Terminplan](#)

Aktuelle Istkosten-Übersicht

B	C	D	E	F	G	H	
Inhalt und Umfang	Ressource			Prognose			
		Plan	IST	Erwartung	Gesamt- erwartung	Abweichung	
Maschinenumzug							
Transport an neuen Standort		5.000 €	6000		6.000 €	-1.000 €	
Transportbegleitung		1.500 €	1800		1.800 €	-300 €	
Entladung / Montage					0 €	0 €	
Kran		2.000 €	2000		2.000 €	0 €	
Transport zum Standort		- €			0 €	0 €	
Montage		25.000 €	15000	10000	25.000 €	0 €	
Inbetriebnahme		5.000 €		5000	5.000 €	0 €	
Kundenabnahme		- €			0 €	0 €	
Summen		82.600 €	64.000 €		89.400 €	-6.800 €	

Inhalt und Umfang	Ressource	Prognose				
		Plan	IST	Erwartung	Gesamt- erwartung	Abweichung
Maschinenumzug		26.09.2017	31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017	31.10.2017
		(Vorkalkulation)	(angefallene Kosten)	(Schätzung - Angebot...)	Summe IST plus Erwartung	
		Kosten (€)	Kosten (€)	Kosten (€)	Kosten (€)	Kosten (€)
Umzug Werkzeugmaschine						
Vorprojekt-Bedarfsklärung		1.000 €	300 €	700 €	1.000 €	0 €
Bestandsaufnahme		1.000 €	500 €	800 €	1.300 €	-300 €
Planung						
Kalkulation/Budgetierung		1.000 €	1.000 €		1.000 €	0 €
Transportgenehmigungen		3.000 €	1.800 €	1.400 €	3.200 €	-200 €
Angebotsausschreibung		500 €	500 €		500 €	0 €
Zeitplanung		2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	0 €
Auftragsvergabe		100 €	100 €		100 €	0 €
Infrastruktur						
Standort		- €			0 €	0 €
Verkehrswege/Anbindung		5.000 €	500 €	6.000 €	6.500 €	-1.500 €
Druckluftversorgung		- €			0 €	0 €
Strom		- €			0 €	0 €
Demontage / Verpackung						
Demontage / Verpackung		25.000 €	28.000 €	500 €	28.500 €	-3.500 €
Transport zum Verladeplatz		500 €	500 €		500 €	0 €
Verladung						
LKW, Kran		5.000 €	5000		5.000 €	0 €
Transportsicherung		- €			0 €	0 €
Transport						
Transport an neuen Standort		5.000 €	6000		6.000 €	-1.000 €
Transportbegleitung		1.500 €	1800		1.800 €	-300 €
Entladung / Montage						
Kran		2.000 €	2000		2.000 €	0 €
Transport zum Standort		- €			0 €	0 €
Montage		25.000 €	15000	10000	25.000 €	0 €
Inbetriebnahme		5.000 €		5000	5.000 €	0 €
Kundenabnahme		- €			0 €	0 €
Summen		82.600 €	64.000 €		89.400 €	-6.800 €

Abweichungen & Maßnahmen

Bestandsaufnahme	1.000 €	500 €	800 €	1.300 €	-300 €
Transportgenehmigungen	3.000 €	1.800 €	1.400 €	3.200 €	-200 €
Verkehrswege/Anbindung	5.000 €	500 €	6.000 €	6.500 €	-1.500 €
Demontage / Verpackung	25.000 €	28.000 €	500 €	28.500 €	-3.500 €
Transport an neuen Stand	5.000 €	6000		6.000 €	-1.000 €
Transportbegleitung	1.500 €	1800		1.800 €	-300 €

[Verknüpfung](#)

Geplante Aktivitäten

Geplante Aktivitäten:

- Nachkalkulation Montage / Inbetriebnahme
- Abschlussgespräch intern
- Nachbesprechung Kunde

....Ende Report

